

О ходе реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

В рамках реализации национального проекта **«Жилье и городская среда»** регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** в 2023 году на территории городского поселения город Нерехта запланировано благоустройство 6 дворовых территорий и 1 общественной территории.


28.01.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района на 2023 год (№34626000-1-2023-004), 27.06.2023 заключено доп. соглашение (№ 34626000-1-2023-004/1), общий размер субсидии составляет 12 263 000,00 руб., из них:

федеральный бюджет — 9 105 225,00 руб.;

областной бюджет — 91 975,00 руб.;

бюджет муниципального района город Нерехта и Нерехтский район — 3 065 800,00 руб.

Фото выполнения работ по благоустройству придомовых территорий по состоянию на 28.06.2023

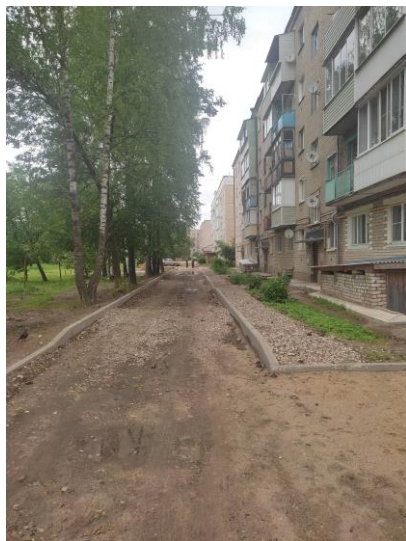

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 9
19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000500001 с ИП Атоян Людвик Левонович (г. Кострома).

Стоимость контракта составила 1 152,46 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- демонтаж бордюрных камней;
- установка бордюрных камней;
- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров;
- устройство подстилающего слоя из щебня (тротуар).
- валка деревьев, выкорчевка кустарниковых растений выполнена силами ООО «Теплый дом».

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.07.2023.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 9



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11
19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000490001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость контракта составила 1 033,24 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- демонтаж бордюрных камней;
- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров;
- установка бордюрных камней;
- устройство подстилающего слоя из щебня (тротуар) - 50%.

- валка деревьев, выкорчевка кустарниковых растений выполнена силами ООО

«ЭнергоЭффективныйДом».

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.07.2023.



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 13
26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000520001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость контракта составила 1 459,87 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- демонтаж бордюрных камней;
- установка бордюрных камней;
- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров;
- устройство подстилающего слоя из щебня (тротуар) - 50%.

- валка деревьев, выкорчевка кустарниковых растений выполнена силами ООО «Теплый дом».

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.07.2023.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 13



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15
26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000530001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость контракта составила 1 243,58 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- демонтаж бордюрных камней;
- установка бордюрных камней;
- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров;
- устройство подстилающего слоя из щебня (тротуар).
- валка деревьев, выкорчевка кустарниковых растений выполнена силами ООО «Теплый дом».

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.07.2023.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17
19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000480001 с ИП Атоян Людвик Левонович (г. Кострома).

Стоимость контракта составила 1 316,60 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- валка деревьев (с выкорчевкой пней);
- демонтаж бордюрных камней (185 м);
- установка бордюрных камней;
- устройство оснований толщиной из щебня;

- выкорчевка кустарниковых растений
выполнена силами ООО «Теплый дом».

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.07.2023.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 19
17.04.2023 заключен муниципальный контракт № 01413000266230000170001 с ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Стоимость контракта составила 1 565,88 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 работы выполнены в полном объеме.

Сроки выполнения работ: с 17.04.2023 до 01.07.2023.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 19

Фото выполнения работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) по состоянию на 28.06.2023



Стадион «Дружба» (вариант 2)

Стадион «Дружба» (вариант 2)

23.01.2023 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000570001 с ИП Курманов Альмир Рустамович (г.Омск).

По результатам аукциона стоимость контракта составила 4 548,824 тыс. руб.

По состоянию на 28.06.2023 выполнены следующие работы:

- валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня;
- корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе;
- разработка грунта с погрузкой;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.20-40 мм;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.10-20 мм.

Сроки выполнения работ: с 01.04.2023 до 01.08.2023.
